




# Pressegespräch zur Sperrung der Sachsen- Franken-Magistrale

zwischen Neukieritzsch und Zwickau  
vom 7. Juli bis 2. September 2024

---

27. Juni 2024 | Gößnitz

# Vorstellung Projektabschnitte

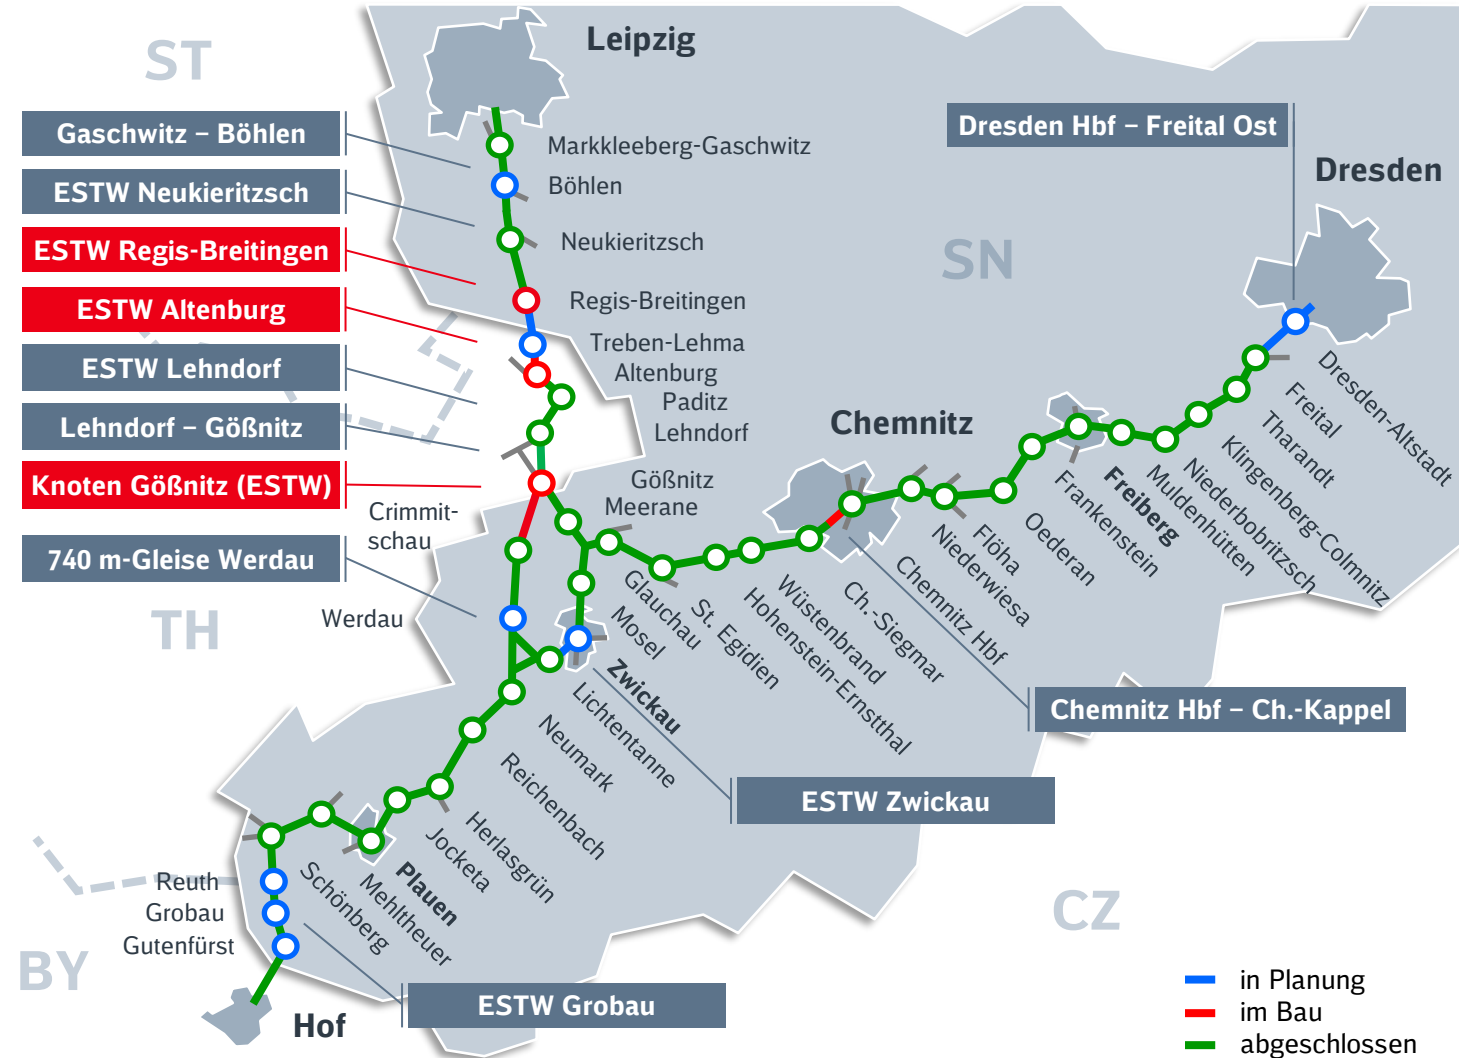

- 1. Projektabschnitt Regis-Breitungen–Treben-Lehma**
2. Projektabschnitt Treben-Lehma–Altenburg
3. Projektabschnitt Knoten Gößnitz
4. Projektabschnitt Gaschwitz-Böhlen


# Projektstand Bauabschnitt Regis-Breitungen–Treben-Lehma



Maßnahmen Bph 1.0 vom 07.07.2024 bis 02.09.2024



- Neubau Bahnsteig 1 im Bahnhof Regis-Breitungen
- Neubau Gleis 1 im Bahnhofsbereich Regis-Breitungen und freie Strecke
- Neubau Oberleitung im Bahnhofsbereich Regis-Breitungen und freie Strecke
- Neubau 2 Durchlässe im Bahnhofsbereich Regis-Breitungen und freie Strecke
- Rückbau Gleis 2 im Bahnhofsbereich Regis-Breitungen und freie Strecke

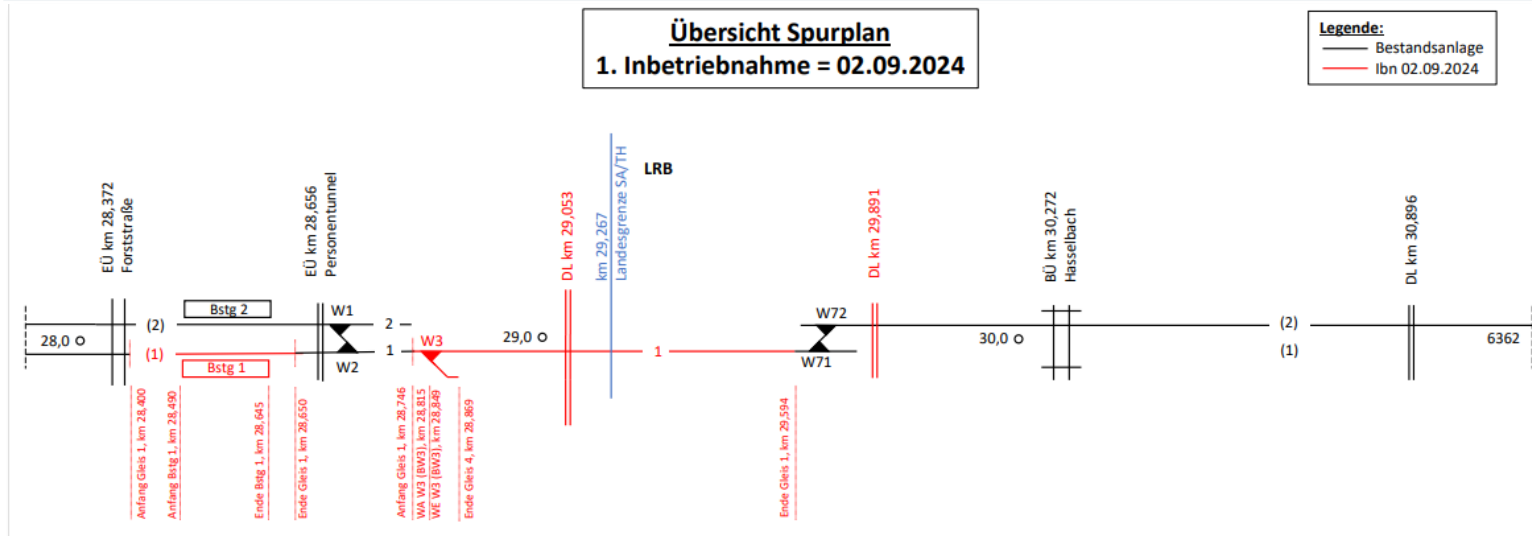

# Projektstand Bauabschnitt Regis-Breitungen–Treben-Lehma

## Aktuelles Geschehen



© DB E&C Lars Tischert

Abb. 1 Maßnahmen zum Absammeln Zauneidechsen



© DB E&C Albrecht Trusch

Abb. 2 Schotteraufbereitung auf Baueinrichtungsfläche



© DB E&C Jens Wetzel

Abb. 3 Kampfmittelondierung im Bereich Bf Regis-Breitungen



© DB E&C Jens Wetzel

Abb. 4 Herstellung Baustraßen

1. Projektabschnitt Bahnhof Regis-Breitingen
- 2. Projektabschnitt Treben-Lehma-Altenburg**
3. Projektabschnitt Knoten Gößnitz
4. Projektabschnitt Gaschwitz-Böhlen

# Projektstand Bauabschnitt Treben-Lehma-Altenburg



Bauphasenplanung Bph 3.1 vom 25.08.2023 bis 07.07.2024


**Bauphase 3**  
 Bz 3.1 08/23 - 07/24 11 Monate  
 - Str.gl.re, Bf-gl. 9-10  
 - EÜ Kauerndorfer Allee

**Legende**

- Bestand
- Rückbau
- Neubau
- Neubau Provisorium (bauzeitlich)
- Provisorium fertiggestellt (u. ggf. in Betrieb)
- Neubau fertiggestellt (u. ggf. in Betrieb)
- Behelfskabeltrasse
- Sperrung (bauzeitlich)
- in Betrieb befindliche Infrastruktur
- Logistikgleis

Umbau der Gleise 1 - 4, 9 und 10 im Bereich Bahnhof Altenburg nur beispielhaft zur Information dargestellt, Umbau kann nach Wahl des AN erfolgen

**Anlage 340008**  
 Blatt 1

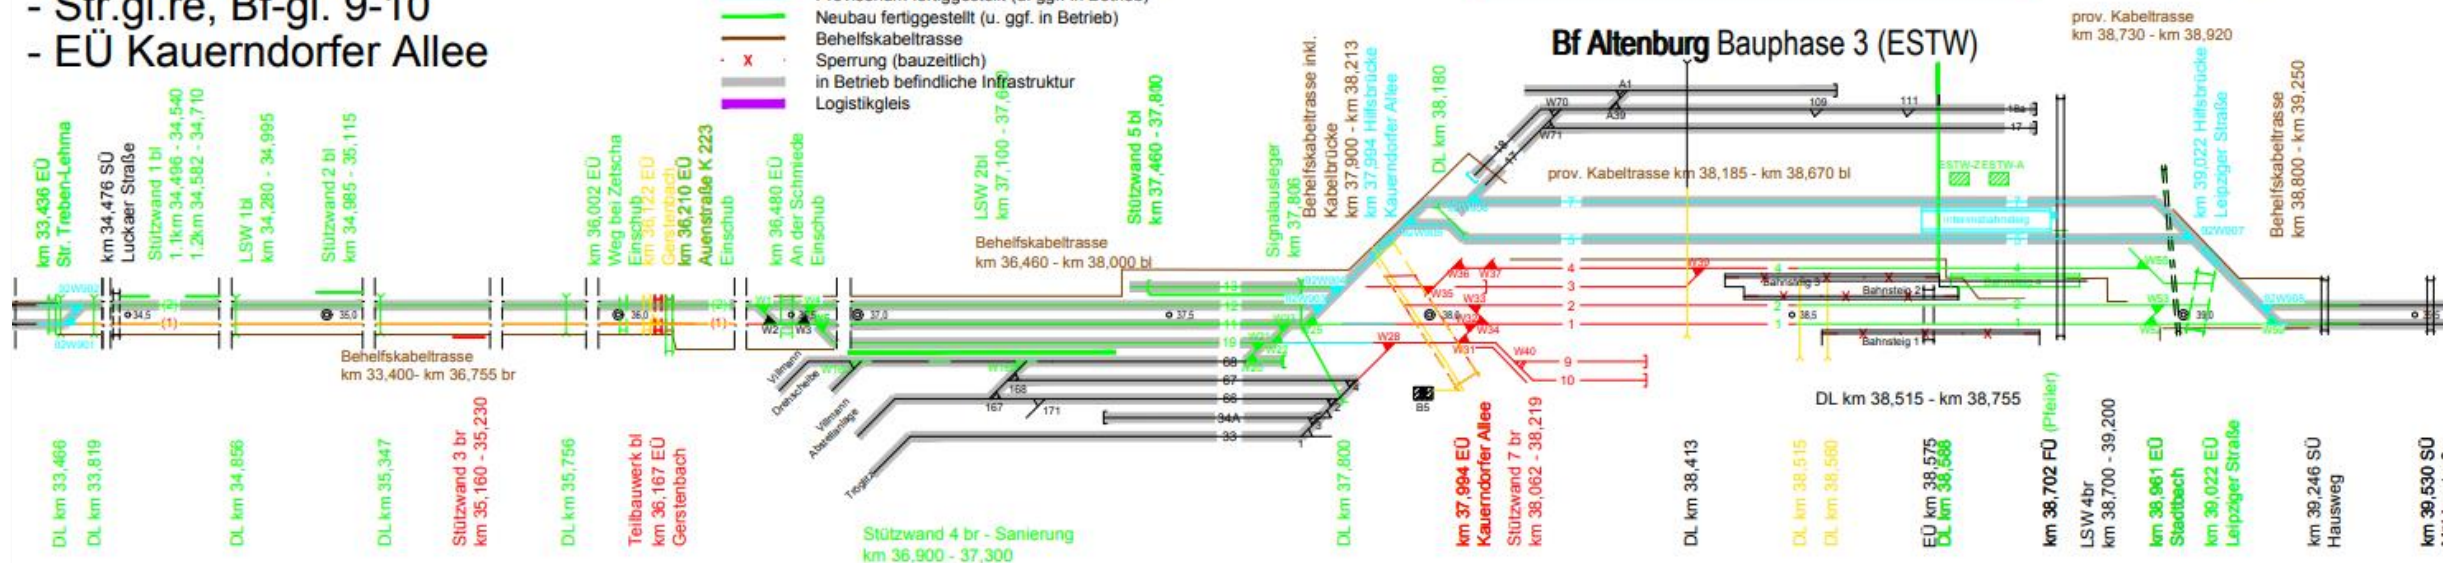

# Projektstand Bauabschnitt Treben-Lehma-Altenburg


Bauphasenplanung Bph 4.0 vom 07.07.2024 bis 02.09.2024



Bauphase 4  
Bz 4.0 - IBN Endzustand  
07-09/24 8 Wochen TSP

- Legende
- Bestand
  - Rückbau
  - Neubau
  - Neubau Provisorium (bauzeitlich)
  - Provisorium fertiggestellt (u. ggf. in Betrieb)
  - Neubau fertiggestellt (u. ggf. in Betrieb)
  - Behelfskabeltrasse
  - Sperrung (bauzeitlich)
  - in Betrieb befindliche Infrastruktur
  - Logistikgleis

Anlage 340009  
Blatt 1

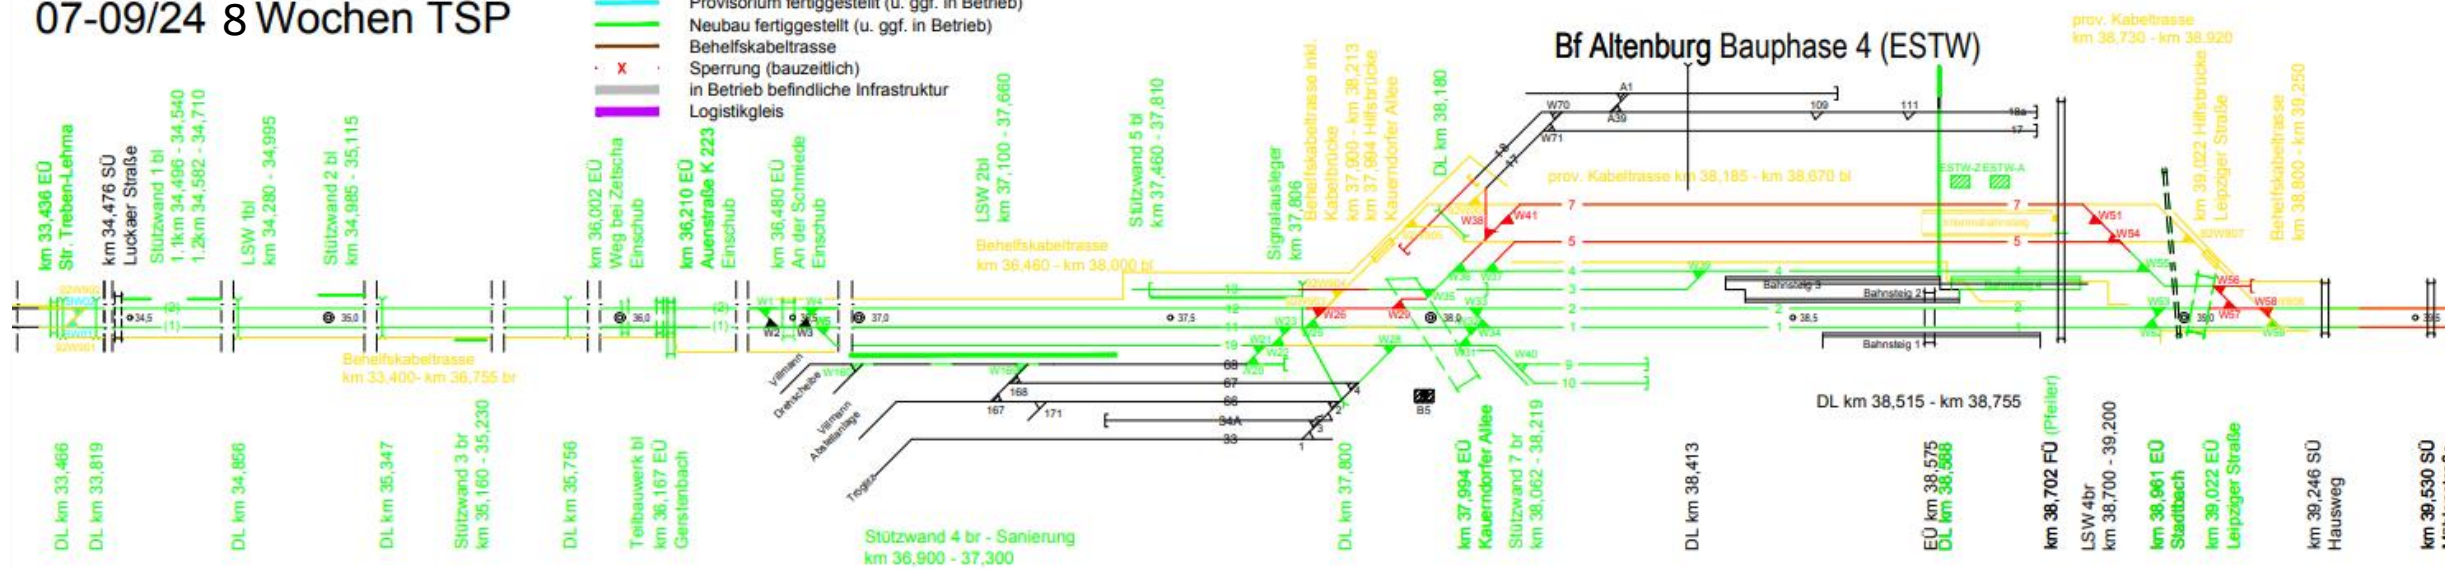



# Projektstand Bauabschnitt Treben-Lehma-Altenburg




Bauphasenplanung Bph 4.1 vom 02.09.2024 bis 20.11.2024

Bauphase 4  
Bz 4.1.b - IBN Endzustand  
09-11/24 betriebliche  
Sperrung Gleise 6 und 7

- Legende
- Bestand
  - Rückbau
  - Neubau
  - Neubau Provisorium (bauzeitlich)
  - Provisorium fertiggestellt (u. ggf. in Betrieb)
  - Neubau fertiggestellt (u. ggf. in Betrieb)
  - Behelfskabeltrasse
  - Sperrung (bauzeitlich)
  - in Betrieb befindliche Infrastruktur
  - Logistikgleis

Anlage 9.12.1  
Blatt 8b

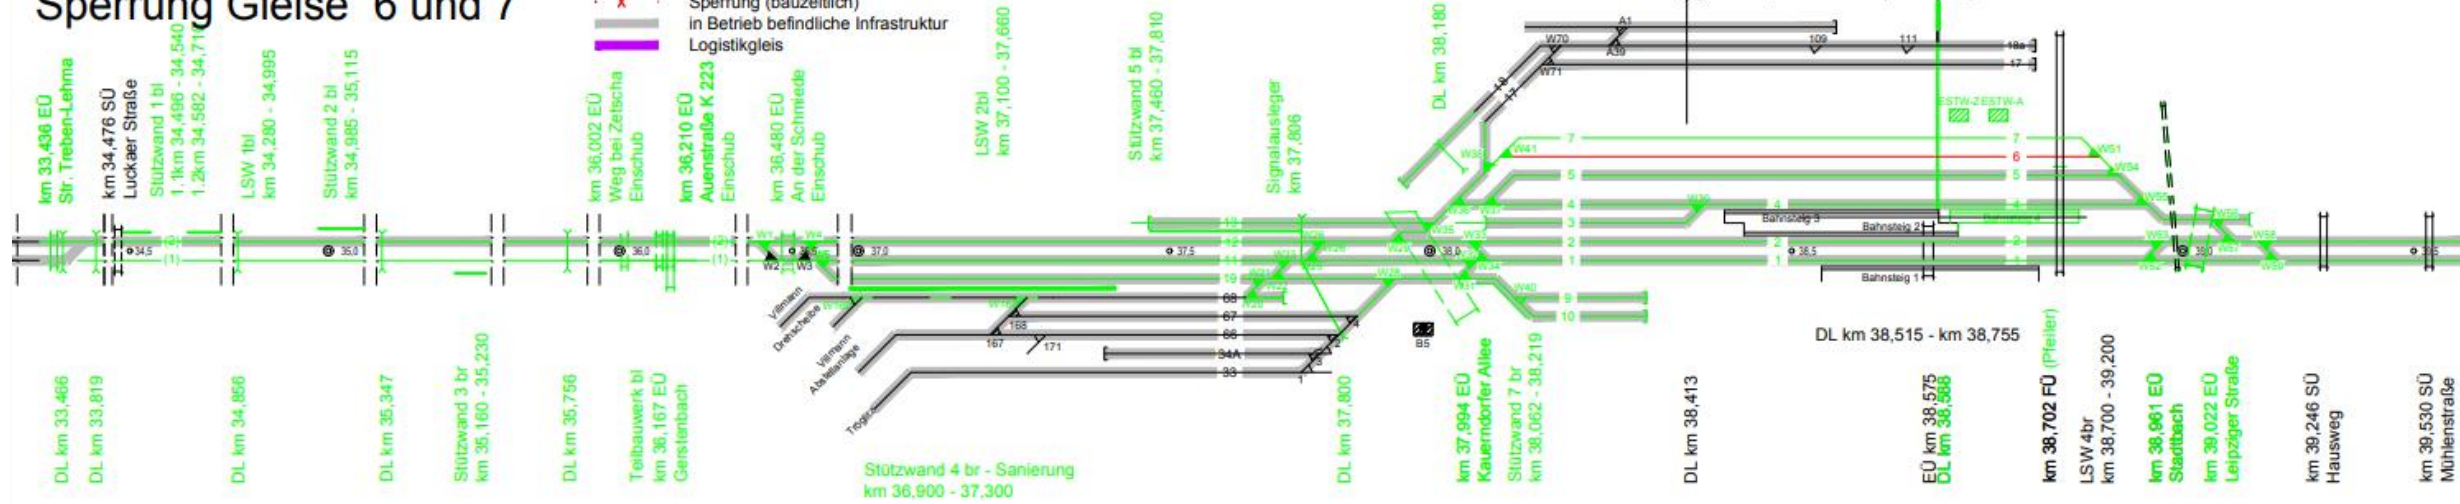

# Projektstand Bauabschnitt Treben-Lehma-Altenburg

aktuelles Baugeschehen



Abb. 1 EÜ km 38,575 Personenunterführung – Schalung Wände



Abb. 2 EÜ km 37,994 EÜ Kauerdorfer Allee



Abb. 3 Bahnsteig 4 und Einkürzen Dach Hausbahnsteig



Abb. 4 EÜ km 36,167 Gerstenbach



Abb. 5 Aufbau LSW 3 und Stützwand 7 – Kopfbalken

# Projektstand Bauabschnitt Treben-Lehma-Altenburg

## Inbetriebnahme Bahnhof Altenburg



### Inbetriebnahme der Bahninfrastruktur sowie der freien Strecke am 02.09.2024



- Fertigstellung der Ingenieurbauwerke
  - Eisenbahnüberführung (EÜ) Kauerndorfer Allee, EÜ Leipziger Straße
  - Lärmschutzwand (LSW) 3, LSW 4
  - Stützwand 3, Stützwand 7
- Umfangreiche Komplettierungsarbeiten im Tiefbau, Oberbau, Gleisbau
- Fertigstellung umfangreicher Kabeltiefbau-, Signal-, Oberleitungsarbeiten
- Fertigstellung der Bahninfrastruktur
  - Herstellung und Inbetriebnahme neuer Bahnsteig 4
  - Wiederinbetriebnahme der Bahnsteige 1 (Hausbahnsteig) und 2/3 (Mittelbahnsteig)
  - Teilneubau der Personenunterführung
  - Wiederaufbau Figur Malcher und historischer Wasserkran
  - Rückbau Interimsbahnsteig und des Zugangs zum Interimsbahnsteig von der Fußgängerüberführung

Reisezeit in Minuten <small>(ca-Angabe da Ri u Gri teilweise unterschiedlich)</small>	Leipzig Hbf	
	Altenburg	
Fpl 2013	55	
	mit S5X	mit S5
Fpl 2015 (City-Tunnel)	40*	46*
Fpl MDSB 2025+	31*	38*

\* davon Fahrzeit Leipzig Hbf - Leipzig Markt 2 Min

Entwicklung der Reisezeiten auf der Relation Leipzig-Hof

1. Projektabschnitt Neukieritzsch
2. Projektabschnitt Treben-Lehma–Altenburg
- 3. Projektabschnitt Knoten Gößnitz**
4. Projektabschnitt Gaschwitz-Böhlen


# Projektabschnitt Umbau Bahnknoten Gößnitz



BA 2 - Maßnahmen im Südkopf in Totalsperrung 07.07.-02.09.2024



- Neubau Gleise 5, 6 einschließlich Weichen, Rückbau Gebäude W3
- Stützwand mit Lärmschutzwand km 54,0 - 54,239
- Arbeiten an 3 Durchlässen (Gleisrückbau, Erdarbeiten, Verfüllung, Oberbau)
- Bahnsteigbau 1/2 (Gründungsarbeiten, Oberflächenschluss und Rinnenausbildung, Ausstattung)
- ZAL-Querung km 53,948 (Baugrube, Gleisrückbau, Leitungsverlegung mit Verfüllung, Lückenschluss, Oberbau)
- Gasleitungsquerung km 54,305 (Gleisrückbau, Arbeiten an Oberleitungsanlagen (OLA), Erdarbeiten, Leitung einbauen, Verfüllung, Oberbau)

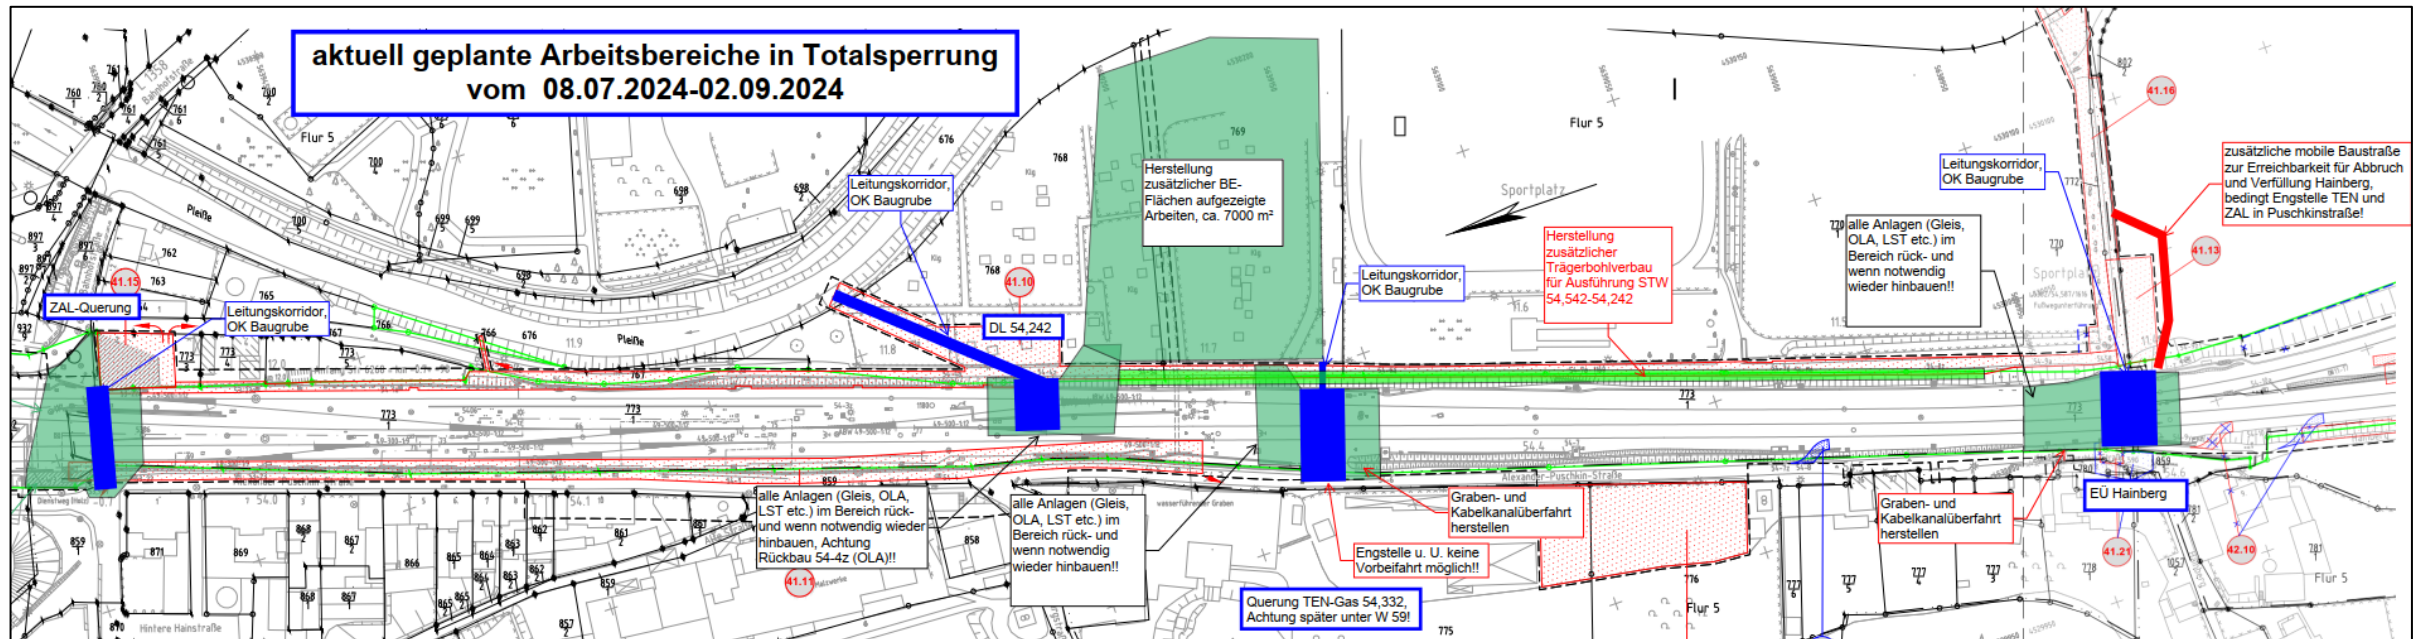

Grafik AN Bickhardt Bau

# Projektabschnitt Umbau Bahnknoten Gößnitz

BA 2 - Maßnahmen EÜ Personentunnel in Totalsperrung 2024



Webcam AN Bickhardt Bau - <https://portal2119.webcam-profi.de/>

→ Personentunnel Ostseite – Ingenieurbau in den Bauabschnitten PU 2-4

# Projektabschnitt Umbau Bahnknoten Gößnitz



## BA 2 - Maßnahmen EÜ Hainberg in Totalsperrung 2024



Webcam AN Bickhardt Bau - <https://portal2119.webcam-profi.de/>

- Gleisrückbauarbeiten und Vorbereitungen Zuwegung für Gerätetechnik Spezialtiefbau
- Baugrubenaushub und Abbruch Bereich Bestandsbauwerk Eisenbahnüberführung Hainberg
- Bodenverbesserung, Bodenaustausch Gründungssohle
- Verschubbahn Lücke/ Baugrube Stahlbeton herstellen
- Bauvorbereitung Vershub
- Vershub Bauwerk
- Unterpressen Bodenplatte
- Bauwerk hinterfüllen und Entwässerung herstellen
- Lückenschluss zu Verbauten
- Herstellung Gleisoberbau, Kabeltiefbau und Tiefenentwässerung, Oberleitungsanlagen

# Projektabschnitt Umbau Bahnknoten Gößnitz

## BA 4 - Maßnahmen EÜ Gistige in Totalsperrung 2024



Schüßler Plan Stefanie Mühlbach



Schüßler Plan Marwin Seifert

- Rückbau Oberbau, Bestandsbauwerk, Herstellung Baugrube Endlage, Herstellung Gründungssohle, Herstellung Verschubbahn
- Einschub Bauwerk
- Rückbau Verschubtechnik, Hinterfüllung, Einbau Oberbau, Rückschwenkung Kabel aus Kabelhilfsbrücke, Wiederherstellung Oberleitungsanlage



1. Projektabschnitt Regis-Breitingen - Treben-Lehma
2. Projektabschnitt Treben-Lehma–Altenburg
3. Projektabschnitt Knoten Gößnitz
- 4. Projektabschnitt Gaschwitz-Böhlen**

# Projektstand 5. Bauabschnitt Gaschwitz–Böhlen

Maßnahmen vom 07.07.2024 bis 02.09.2024




- Beginn Herstellung der Medienfreiheit im Bereich Brücke Koburger Straße
- Umverlegungsarbeiten durch die Medieneigentümer
- Rückbau 50 Hz / Tk - Altanlage
- Rückbau Ausplattung am Bahnübergang Rathausstraße
- Erdbauarbeiten Straßenüberführung (SÜ) Koburger Straße, Winkelstützwände, Bohrpfahlwände

Weichenbezeichnung mit ESTW-Kennung „24“.

**Übersicht Spurplan**  
Inbetriebnahme = 27.04.2025

**Legende:**  
— Bestandsanlage  
— lbn 27.04.2025

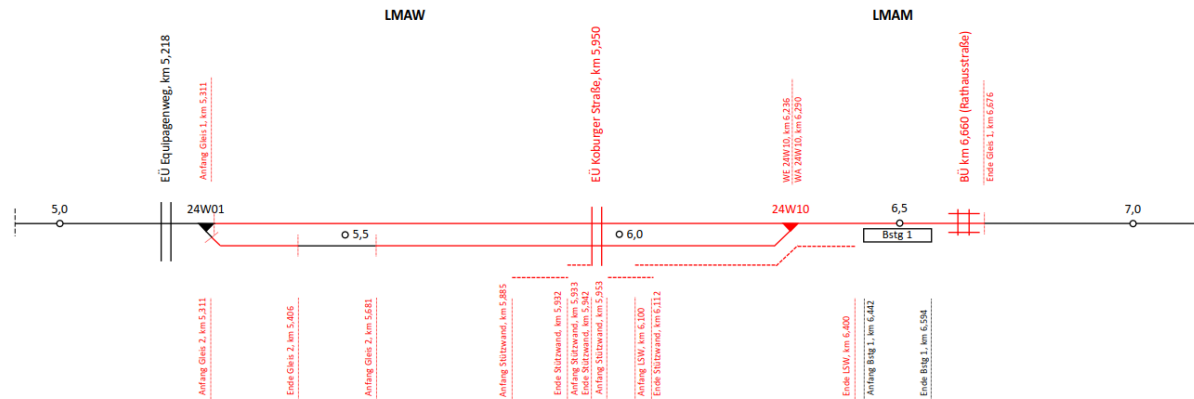

# Projektstand 5. Bauabschnitt Gaschwitz-Böhlen

## Aktuelles Geschehen



© DB E&C Albrecht Trusch

Abb. 1 Absammeln  
Zauneidechsen und  
Umsiedlung



© DB E&C Albrecht Trusch

Abb. 2 bis 02/2024 erfolgte  
Fäll- und  
Rodungsarbeiten



© ARGE PS Beate Bauer

Abb. 3 Aufbau Kabelhilfsbrücke



© ARGE PS Beate Bauer

Abb. 2 Einbau Kabelhilfsbrücke neben SÜ Koburger Straße



© ARGE PS Sven Ponert

Abb. 4 Herstellung Baustraßen

# Kontaktmöglichkeiten und weitere Informationen



Wir stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung!

## Für einen offenen und kontinuierlichen Austausch:

- **Postwurfsendungen** für betroffene Anwohnende bei Nachtarbeiten und lärmintensiven Arbeiten
- **Presseinformationen** bei wichtigen Meilensteinen und Einschränkungen für Anwohnende
- **Dialogveranstaltungen**
- Veröffentlichungen im **Amtsblatt**
- Projektinformationen auf unserer **Website**

## Nächste Termine:

- 27. Juli 2024: Baustelleninformationstag Markkleeberg
- 15. August 2024: Baustelleninformationstag Regis-Breitungen
- 21. September 2024: Tag der Schiene Altenburg

## Informationszentrum Gößnitz:

jeden Dienstag in geraden Kalenderwochen, 14 bis 18 Uhr  
Wehrstraße 18, Gößnitz

## E-Mail:

sachsen-franken-magistrale@deutschebahn.com

## Website:

[www.sachsen-franken-magistrale.com](http://www.sachsen-franken-magistrale.com)  
oder einfach QR-Code scannen






Streckensperrung zwischen Neukieritzsch und Zwickau  
**Ersatzverkehr S 5/S 5X und RE 1/3**  
Verkehrskonzept von 7. Juli bis 2. September 2024

---

- 1. Phase 1**
- 2. Zwischenphase**
- 3. Phase 2**
- 4. Allgemein**

# Phase 1: 07. Juli 2024 – 26. Juli 2024

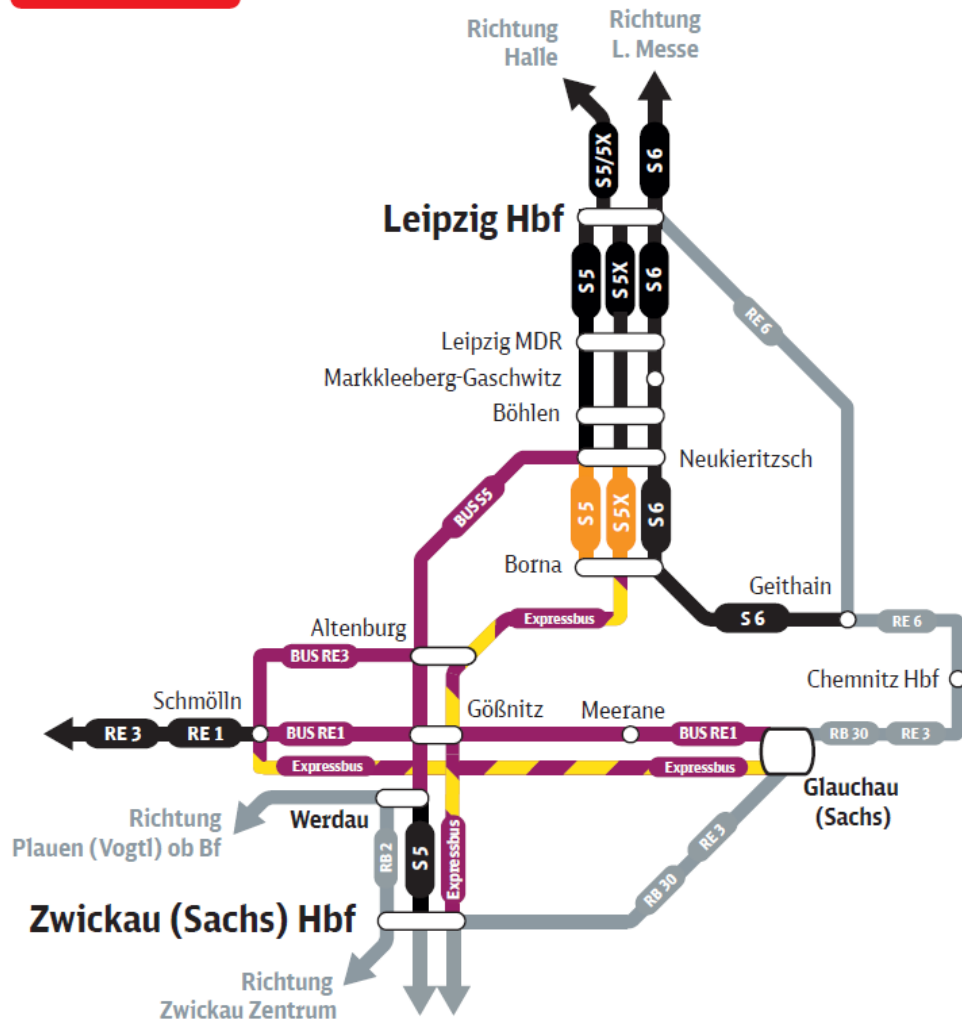

Umleitung

Expressbus

Ersatz mit Bus

angrenzende Strecken

planmäßiger Zugverkehr

– Ponitz wird via Crimmitschau mit Großraumtaxi angebunden



# Zwischenphase 22.7. – 26.7.2024



22.07.2024 (7 Uhr) - 26.07.2024 (22 Uhr)

S6: fährt von Leipzig nach M.-Gaschwitz

Pendelverkehr (S-Bahn): Borna ◀▶ Geithain

S5: bedient zusätzlich den Verkehrshalt Großstädteln der S6 und den Ersatzverkehr Gaschwitz ◀▶ Borna

Großdeuben kann Baustellenbedingt nicht angefahren werden, dieser wird einseitig von Gaschwitz mittels EV angebunden

Umleitung

Expressbus

Ersatz mit Bus


angrenzende Strecken

planmäßiger Zugverkehr





# Phase 2: 26. Juli 2024 – 02. September 2024

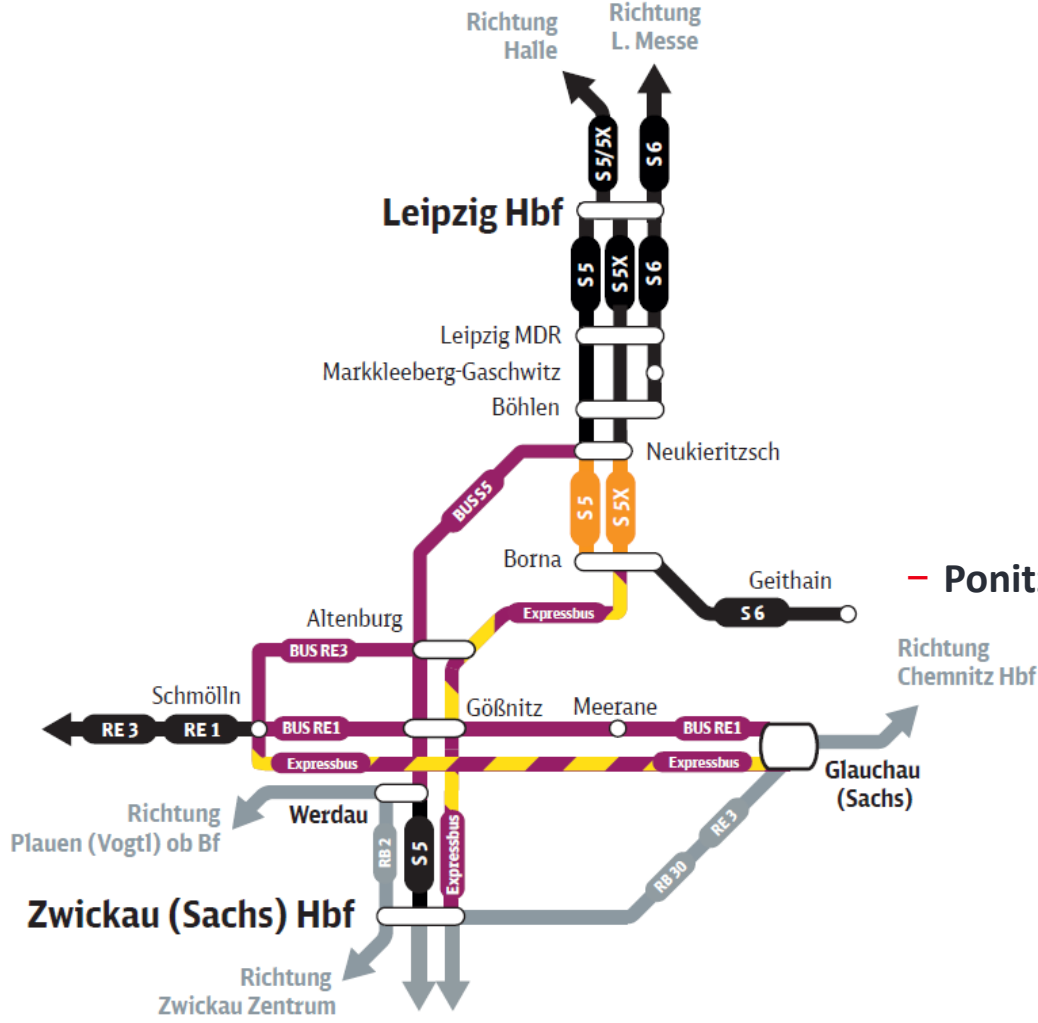

- Ponitz wird via Crimmitschau mit Großraumtaxi angebunden

- Umleitung
- Expressbus
- Ersatz mit Bus
- angrenzende Strecken
- planmäßiger Zugverkehr



# Allgemeines



- **Ponitz wird via Crimmitschau mit Taxi angebunden**
- **Jeweils zwei Busse verkehren pro Richtung auf den Expresslinien (S 5X und RE 1)**
- **Ein Bus pro Richtung für die Verbindungen die alle Halte bedienen (S 5/RE 3)**
- **Bis 05.08.2024 können Fahrgäste (z. B. mit D-Ticket) ab Werdau auch den Umweg via Chemnitz (RE 6) nehmen und sind damit schneller in Leipzig, danach ist auch hier ein SEV-Abschnitt (RE 6: 05.08. - 13.10.2024) wegen einer Streckensperrung zwischen Burgstädt und Geithain**

11:48 – 14:21 | 2h 33min | 2 Umstiege



Details ▾

12:06 – 14:33 | 2h 27min | 3 Umstiege



## Fahrplaninformationen:

- App DB Navigator (Android und iOS)
- [www.bahn.de](http://www.bahn.de)
- [www.s-bahn-mitteldeutschland.de](http://www.s-bahn-mitteldeutschland.de)



**Vielen Dank**
